

Plano Estadual de
Recursos Hídricos
do Rio Grande do Sul

CONCLUSÃO DA ETAPA B
E ELABORAÇÃO DAS ETAPAS C E D

**Programação dos Trabalhos e
Estratégia de Mobilização Social**

Retomada dos Trabalhos

Elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos
do Rio Grande do Sul - Conclusão da ETAPA B e
Elaboração das ETAPAS C e D

PERH-RS




The background features a gradient from dark blue at the top to green at the bottom, overlaid with numerous thin, wavy, horizontal lines in various shades of blue and green, creating a dynamic, fluid effect.

| Histórico e Contexto da Elaboração do PERH-RS


Histórico 1ª Etapa

linha do tempo

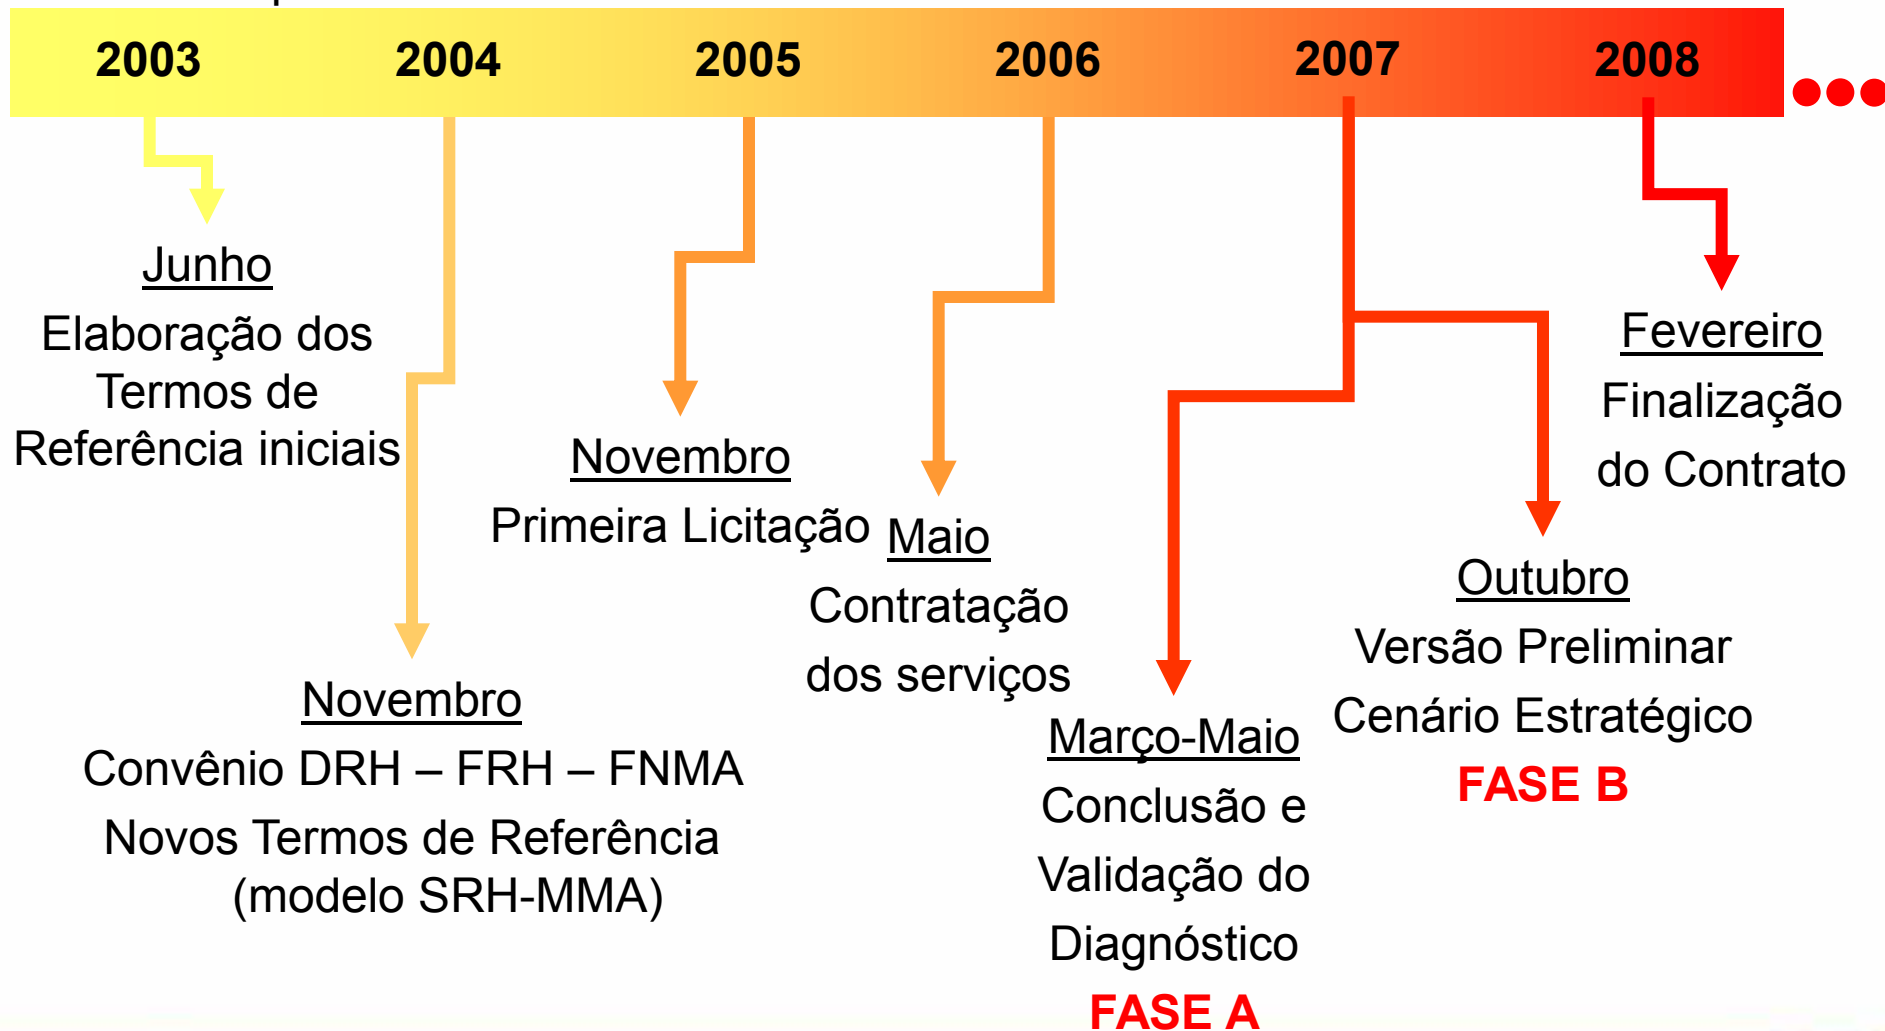

Histórico 2ª Etapa

linha do tempo

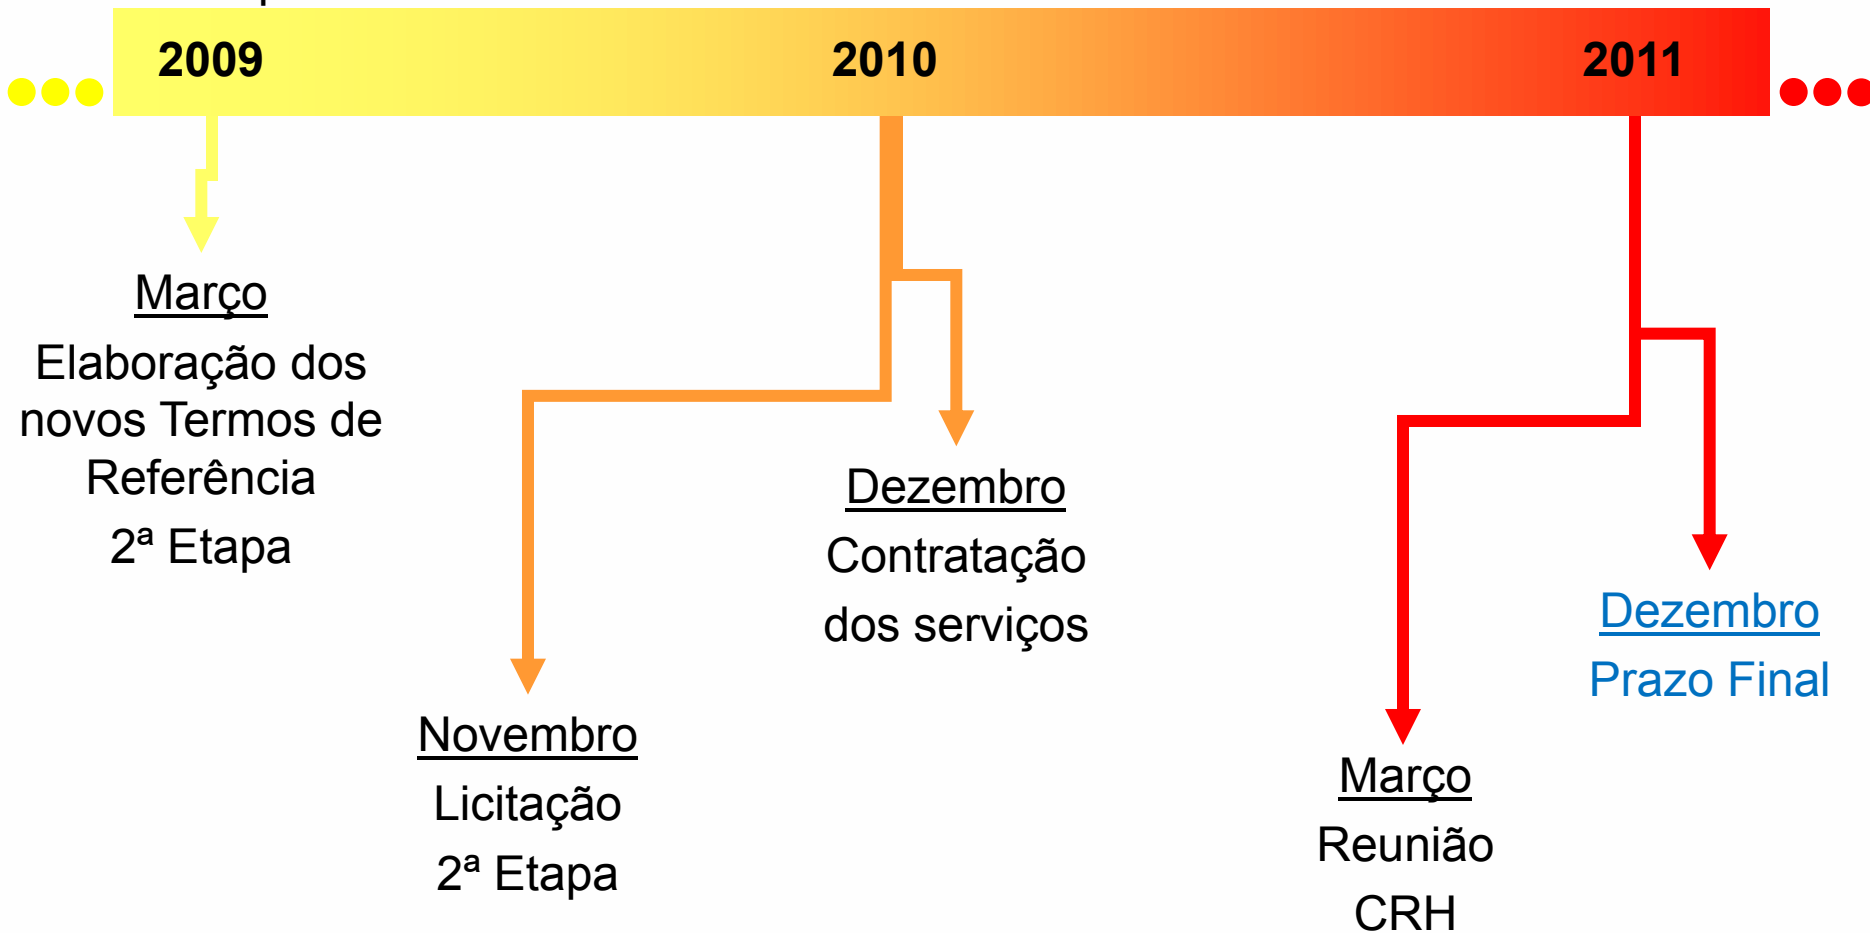

Escopo das Atividades

- **Fase A: Diagnóstico**
Disponibilidades, Demandas e Balanço Hídrico **Concluído**
- **Fase B: Cenários**
Proposição de Alternativas de Compatibilização **Parcialmente Concluído**
- **Fase C: Elaboração do Plano** **A Elaborar**
- **Fase D: Elaboração do Ante-Projeto de Lei** **A Elaborar**

The background features a gradient from dark blue at the top to green at the bottom, overlaid with numerous thin, wavy, horizontal lines that create a sense of motion and depth.

| Ecopo da 2ª Etapa do PERH-RS

Apresentação

- **FASE INICIAL - ATIVIDADES PRELIMINARES**
 - 0.1 - Apresentação do **Plano de Trabalho** para o Desenvolvimento dos Estudos
 - 0.2 - Levantamento das **Informações Disponíveis**

- **FASE B - PROPOSIÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA COMPATIBILIZAR AS DISPONIBILIDADES E AS DEMANDAS HÍDRICAS**
 - **B.1 - Proposição de Alternativas de Compatibilidade das Disponibilidades e Demandas Hídricas**
 - B.1.1 - **Consolidação do Trabalho Já Realizado** Até as Oficinas Setoriais para Formulação dos Cenários Futuros do PERH
 - B.1.2 - Seleção do **Cenário Estratégico do PERH** (Metas do Plano)

Apresentação

- **FASE B - PROPOSIÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA COMPATIBILIZAR AS DISPONIBILIDADES E AS DEMANDAS HÍDRICAS**
 - **B.2 - Articulação e Compatibilidade dos Interesses do Estado com os do Estado Vizinho de Santa Catarina e com os Países Vizinhos**
 - B.2.1 - Análise do Processo de Gestão de **Bacias Compartilhadas com Santa Catarina**
 - B.2.2 - Análise do Processo de Gestão de **Bacias Transfronteiriças**
 - **B.3 - Elaboração do Relatório da Fase B**
 - B.3.1 - Relatório da **Fase B**

Apresentação

- **FASE C - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS**
 - **C.1 - Elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos**
 - C.1.1 - Proposição de **Alternativas de Intervenção e Definição dos Programas** do PERH
 - C.1.2 - Proposição de **Alternativas de Financiamento** para os Programas do PERH e Diretrizes para a Implementação da **Cobrança pelo Uso da Água** no Rio Grande do Sul
 - C.2 - Proposta de Diretrizes para a Articulação do **Enquadramento** dos Recursos Hídricos no Estado do RS

Apresentação

- **FASE C - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS**
 - **C.3 - Proposição de Diretrizes para Consolidação da Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos**
 - **C.4 - Proposição de Esquema Organizacional para Implementação do PERH**
 - **C.5 - Elaboração dos Relatórios Síntese das Atividades de Elaboração do PERH**
 - **C.5.1 - Relatórios Síntese do PERH**
- **FASE D - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO PERH/RS**
 - **D.1 - Elaboração do Ante-Projeto de Lei do PERH/RS**

The background features a gradient from dark blue at the top to green at the bottom, overlaid with multiple layers of wavy, horizontal lines in various shades of blue and green, creating a sense of motion and depth.

| Programação dos Trabalhos

Cronograma

Dia Inicial: 16/12/2010

Dia Final: 16/11/2011

Fase / Atividade / Tarefa	Tempo (meses corridos)											
	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11
Atividades Preliminares	[Barra azul cobrindo dez/10 a fev/11]											
0.1. Apresentação do Plano de Trabalho para Desenvolvimento dos Estudos	[Barra azul cobrindo dez/10 a jan/11]											
0.2. Levantamento das Informações Disponíveis	[Barra azul cobrindo jan/11 a fev/11]											
FASE B - Proposição de Alternativas para Compatibilizar as Disponibilidades e as Demandas Hídricas	[Barra azul cobrindo fev/11 a jun/11]											
B.1. Proposição de Alternativas de Compatibilidade das Disponibilidades e Demandas Hídricas	[Barra azul cobrindo fev/11 a abr/11]											
B.1.1. Consolidação do Trabalho Já Realizado Até as Oficinas Setoriais para Formulação dos Cenários Futuros	[Barra cinza cobrindo fev/11 a mar/11]											
B.1.2. Seleção do Cenário Estratégico do PERH (Metas do Plano)	[Barra cinza cobrindo mar/11 a mai/11]											
B.2. Articulação e Compatibilidade dos Interesses do Estado com os do Estado de Santa Catarina e com os Países Vizinhos	[Barra azul cobrindo fev/11 a jun/11]											
B.2.1. Análise do Processo de Gestão de Bacias Compartilhadas com Santa Catarina	[Barra cinza cobrindo fev/11 a jun/11]											
B.2.2. Análise do Processo de Gestão de Bacias Transfronteiriças	[Barra cinza cobrindo fev/11 a jun/11]											
B.3. Elaboração de Relatório da Fase B	[Barra azul cobrindo jun/11 a jul/11]											
B.3.1. Relatório da Fase B	[Barra cinza cobrindo jun/11 a jul/11]											
FASE C - Elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos	[Barra azul cobrindo jul/11 a nov/11]											
C.1. Elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos	[Barra azul cobrindo jul/11 a set/11]											
C.1.1. Proposição de Alternativas de Intervenção e Definição dos Programas	[Barra cinza cobrindo jul/11 a ago/11]											
C.1.2. Proposição de Alternativas de Financiamento dos Programas do PERH e Diretrizes para a Implantação da Cobrança pelo Uso da Água	[Barra cinza cobrindo ago/11 a set/11]											
C.2. Proposta de Diretrizes para a Articulação de Enquadramento dos Recursos Hídricos no Estado	[Barra azul cobrindo jul/11 a set/11]											
C.3. Proposição de Diretrizes para Consolidação da Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos	[Barra azul cobrindo jul/11 a set/11]											
C.4. Proposição de Estrutura Organizacional para a Implementação do PERH	[Barra azul cobrindo jul/11 a set/11]											
C.5. Elaboração do Relatório Síntese das Atividades de Elaboração do PERH	[Barra azul cobrindo set/11 a nov/11]											
C.5.1. Relatório Síntese do PERH	[Barra cinza cobrindo set/11 a out/11]											
Fase D - Elaboração do Projeto de Lei do PERH	[Barra azul cobrindo out/11 a nov/11]											
D.1. Elaboração do Projeto de Lei do PERH	[Barra azul cobrindo out/11 a nov/11]											

Legenda:

- Duração de fase
- Duração de atividade
- Duração de tarefa

◆ Relatórios


Produtos e Prazos

Produto	Repasse (% do valor do contrato)	Prazo
Relatório Atividades Preliminares - Consolidação do Plano de Trabalho (item 4.1.1)	10	ENTREGUE
Relatório Consolidação das Informações Existentes, Conceitos Utilizados e Plano de Mobilização (item 4.1.2)	20	ENTREGUE
Relatório com Cenário Estratégico (item B.1.2)	20	MAIO/2011
Relatório da Fase B (item B.3)	20	JUNHO/2011
Relatórios Síntese do PERH (item C.5)	20	OUTUBRO/2011
Relatório do Projeto de Lei do PERH (item D.1)	10	NOBEMBRO/2011


The background features a gradient from dark blue at the top to green at the bottom, overlaid with multiple layers of wavy, horizontal lines in various shades of blue and green, creating a sense of movement and depth.

| Estratégia de Mobilização Social

Estratégia de Mobilização Social: duas vertentes de trabalho – técnico x social

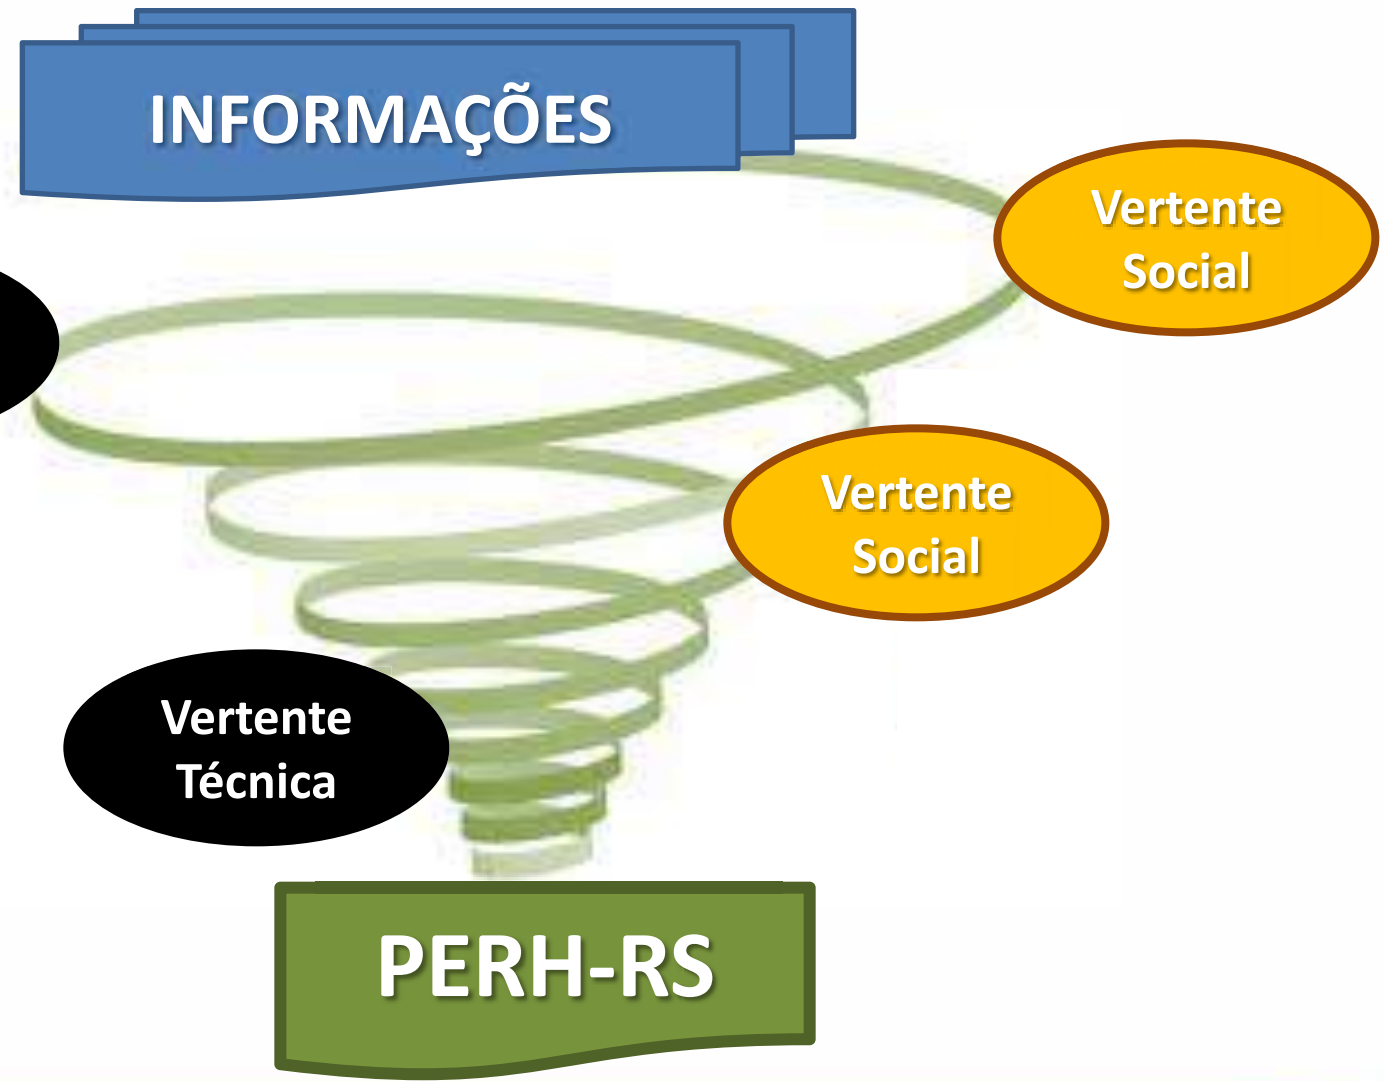

Estratégia de Mobilização Social: o diálogo do PERH-RS com o CRH e com a Sociedade

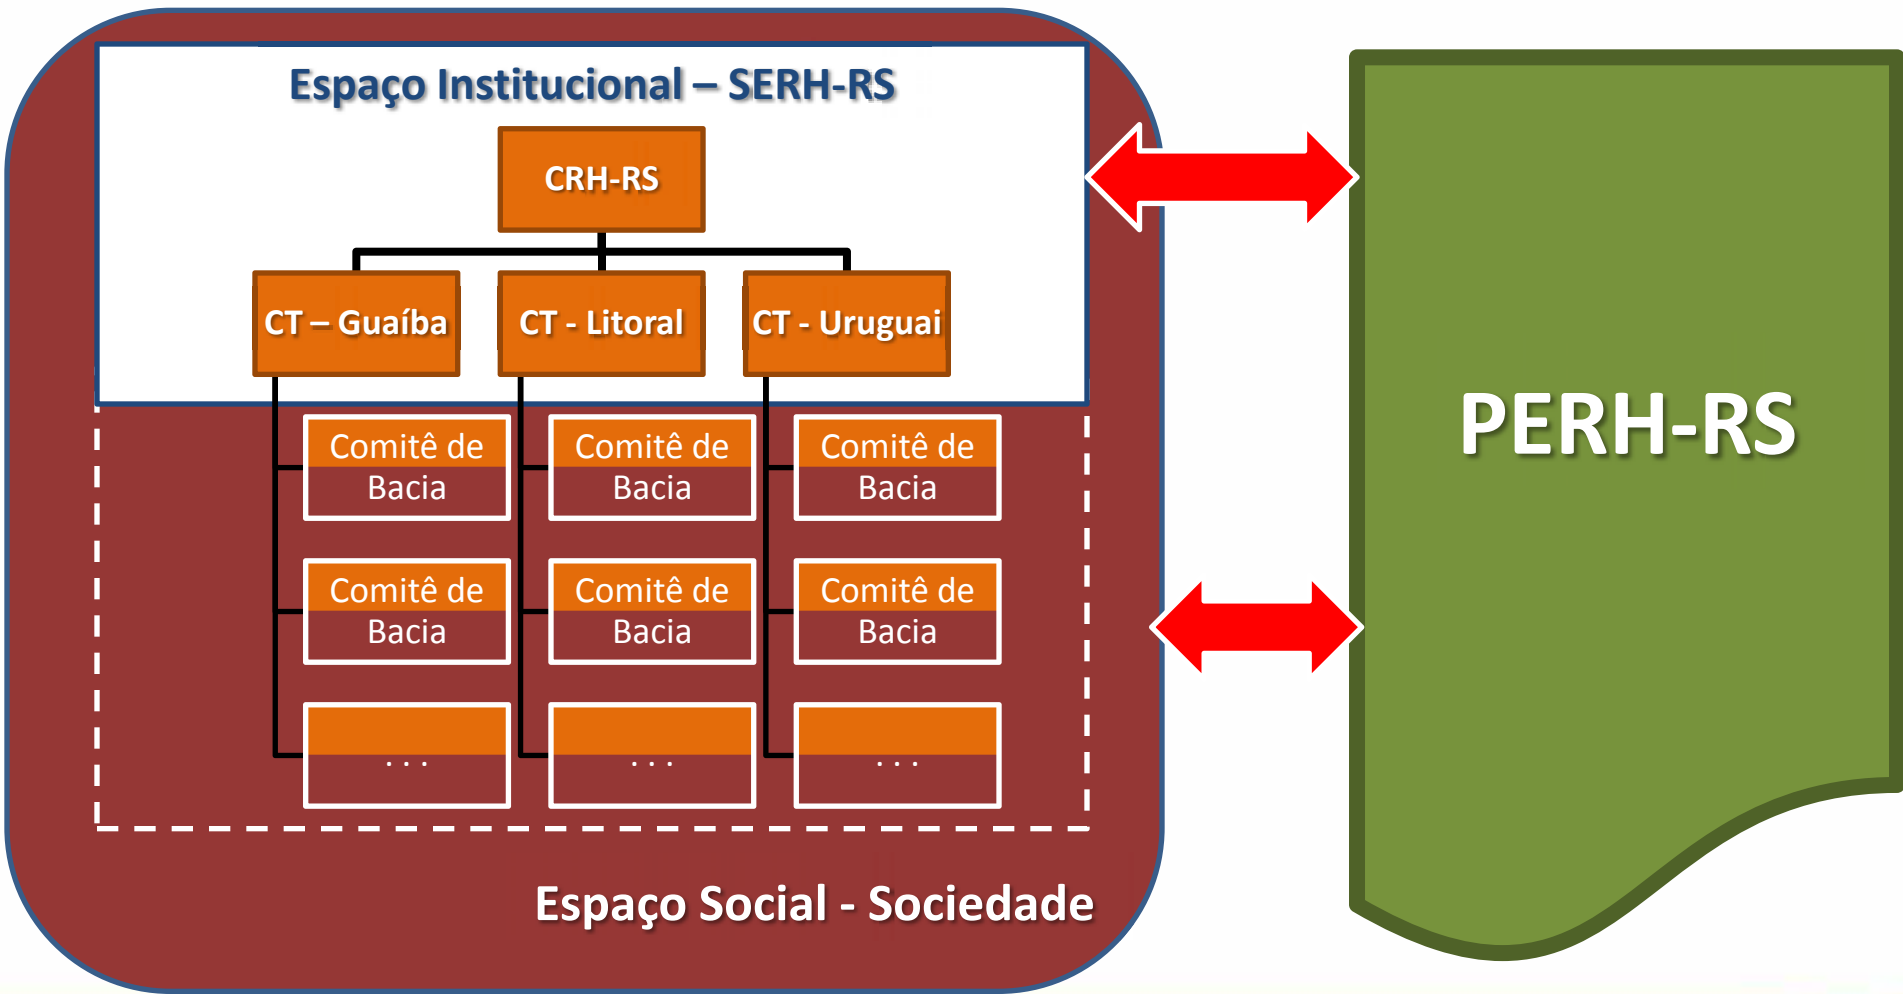

Estratégia de Mobilização Social (10 passos)

Passos	Ações
01	<ul style="list-style-type: none"> • Correspondência do Presidente do CRH/RS, aos Conselheiros e aos Comitês informando: <ul style="list-style-type: none"> • a retomado do processo; • a coordenação do Diretor do DRH e, • a convocação para participar do Seminário PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS: Passado, Presente e Futuro. • Mesma correspondência encaminhada a: organizações de usuários, organizações comunitárias, imprensa, órgãos públicos, assembleia, organizações técnicas, Governo de SC, Sistema Nacional de RH e MRE, organizações de gênero. Em março/2011.
02	<ul style="list-style-type: none"> • Organização de um Programa de Mídia, coordenado pela SEMA e envolvendo as assessorias de comunicação dos diferentes atores na construção do PERH/RS, contando com o apoio da Consultora.

Estratégia de Mobilização Social (10 passos)

Passos	Ações
03	<ul style="list-style-type: none"> • Realização do Seminário e de Oficinas específicas (Imprensa, Assembléia, Organizações de Gênero e Organizações Religiosas). • Lançamento do Programa de Mídia.
04	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilização das Câmaras Técnicas de Gestão do CRH/RS: apresentação do que foi realizado, cenário futuro atualizado e o Plano de Trabalho. • Produto: cronograma de reuniões das CT's, em suas áreas de abrangência, envolvendo usuários, sociedade e governo.
05	<ul style="list-style-type: none"> • Realização das reuniões. Proposição: <ul style="list-style-type: none"> • CTG (uma reunião ou Santa Cruz); • CTU (uma reunião e outra em Uruguaiana ou Rosário ou Livramento); • CTL (uma reunião em Tramandaí e outra). • Realização do Seminário Final do Cenário Estratégico. • Produto: Cenário futuro acordado e rol de necessidades (programas, projetos e ações). Até final de abril/2011.

Estratégia de Mobilização Social (10 passos)

Passos	Ações
06	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniões Temáticas promovidas pelo DRH-SEMA: usuários, militantes, Governos e especialistas. • Produto: correções, diretrizes, orientações para propostas de acordos, políticas, etc. Entre julho e agosto/2011.
07	<ul style="list-style-type: none"> • Realização do Seminário Final dos Acordos Globais (programas, projetos, ações). Em setembro/2011. • Produto: Estabelecimento de Acordos Globais (Estadual). Elaboração do I PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS VERTENTE PARTICIPATIVA (conclusão)
08	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião técnica para fechamento do Plano, a partir do Acordos Globais • Produto: Conclusão do PERH. Em outubro/2011. Elaboração do I PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS VERTENTE TÉCNICA (conclusão)
09	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião Extraordinária do CRH/RS: apresentação e aprovação do PERH/RS. Em novembro/2011.
10	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentação e encaminhamento à Assembléia Legislativa.

The background features a gradient from dark blue at the top to green at the bottom, overlaid with numerous thin, overlapping, wavy lines that create a sense of motion and depth.

| Contatos

Contatos

- Departamento de Recursos Hídricos – SEMA
drh-gabinete@sema.rs.gov.br
(51) 3288 8141
- Conselho de Recursos Hídricos
crh@sema.rs.gov.br
(51) 3288 8142
- Ecoplan Engenharia
perhrs@ecoplan.com.br
(51) 3272 8953



➤ Na internet:

www.sema.rs.gov.br

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul

CONCLUSÃO DA ETAPA B
E ELABORAÇÃO DAS ETAPAS C E D



Rua Felicíssimo de Azevedo, Nº 924
Bairro Higienópolis - Porto Alegre / RS
Fone: (51) 3372.8990 / Fax: (51) 3342.3345
ecoplan@ecoplan.com.br - www.ecoplan.com.br
